


計画工程表

※ (赤線は実績)



履行報告書(令和3年10月分)

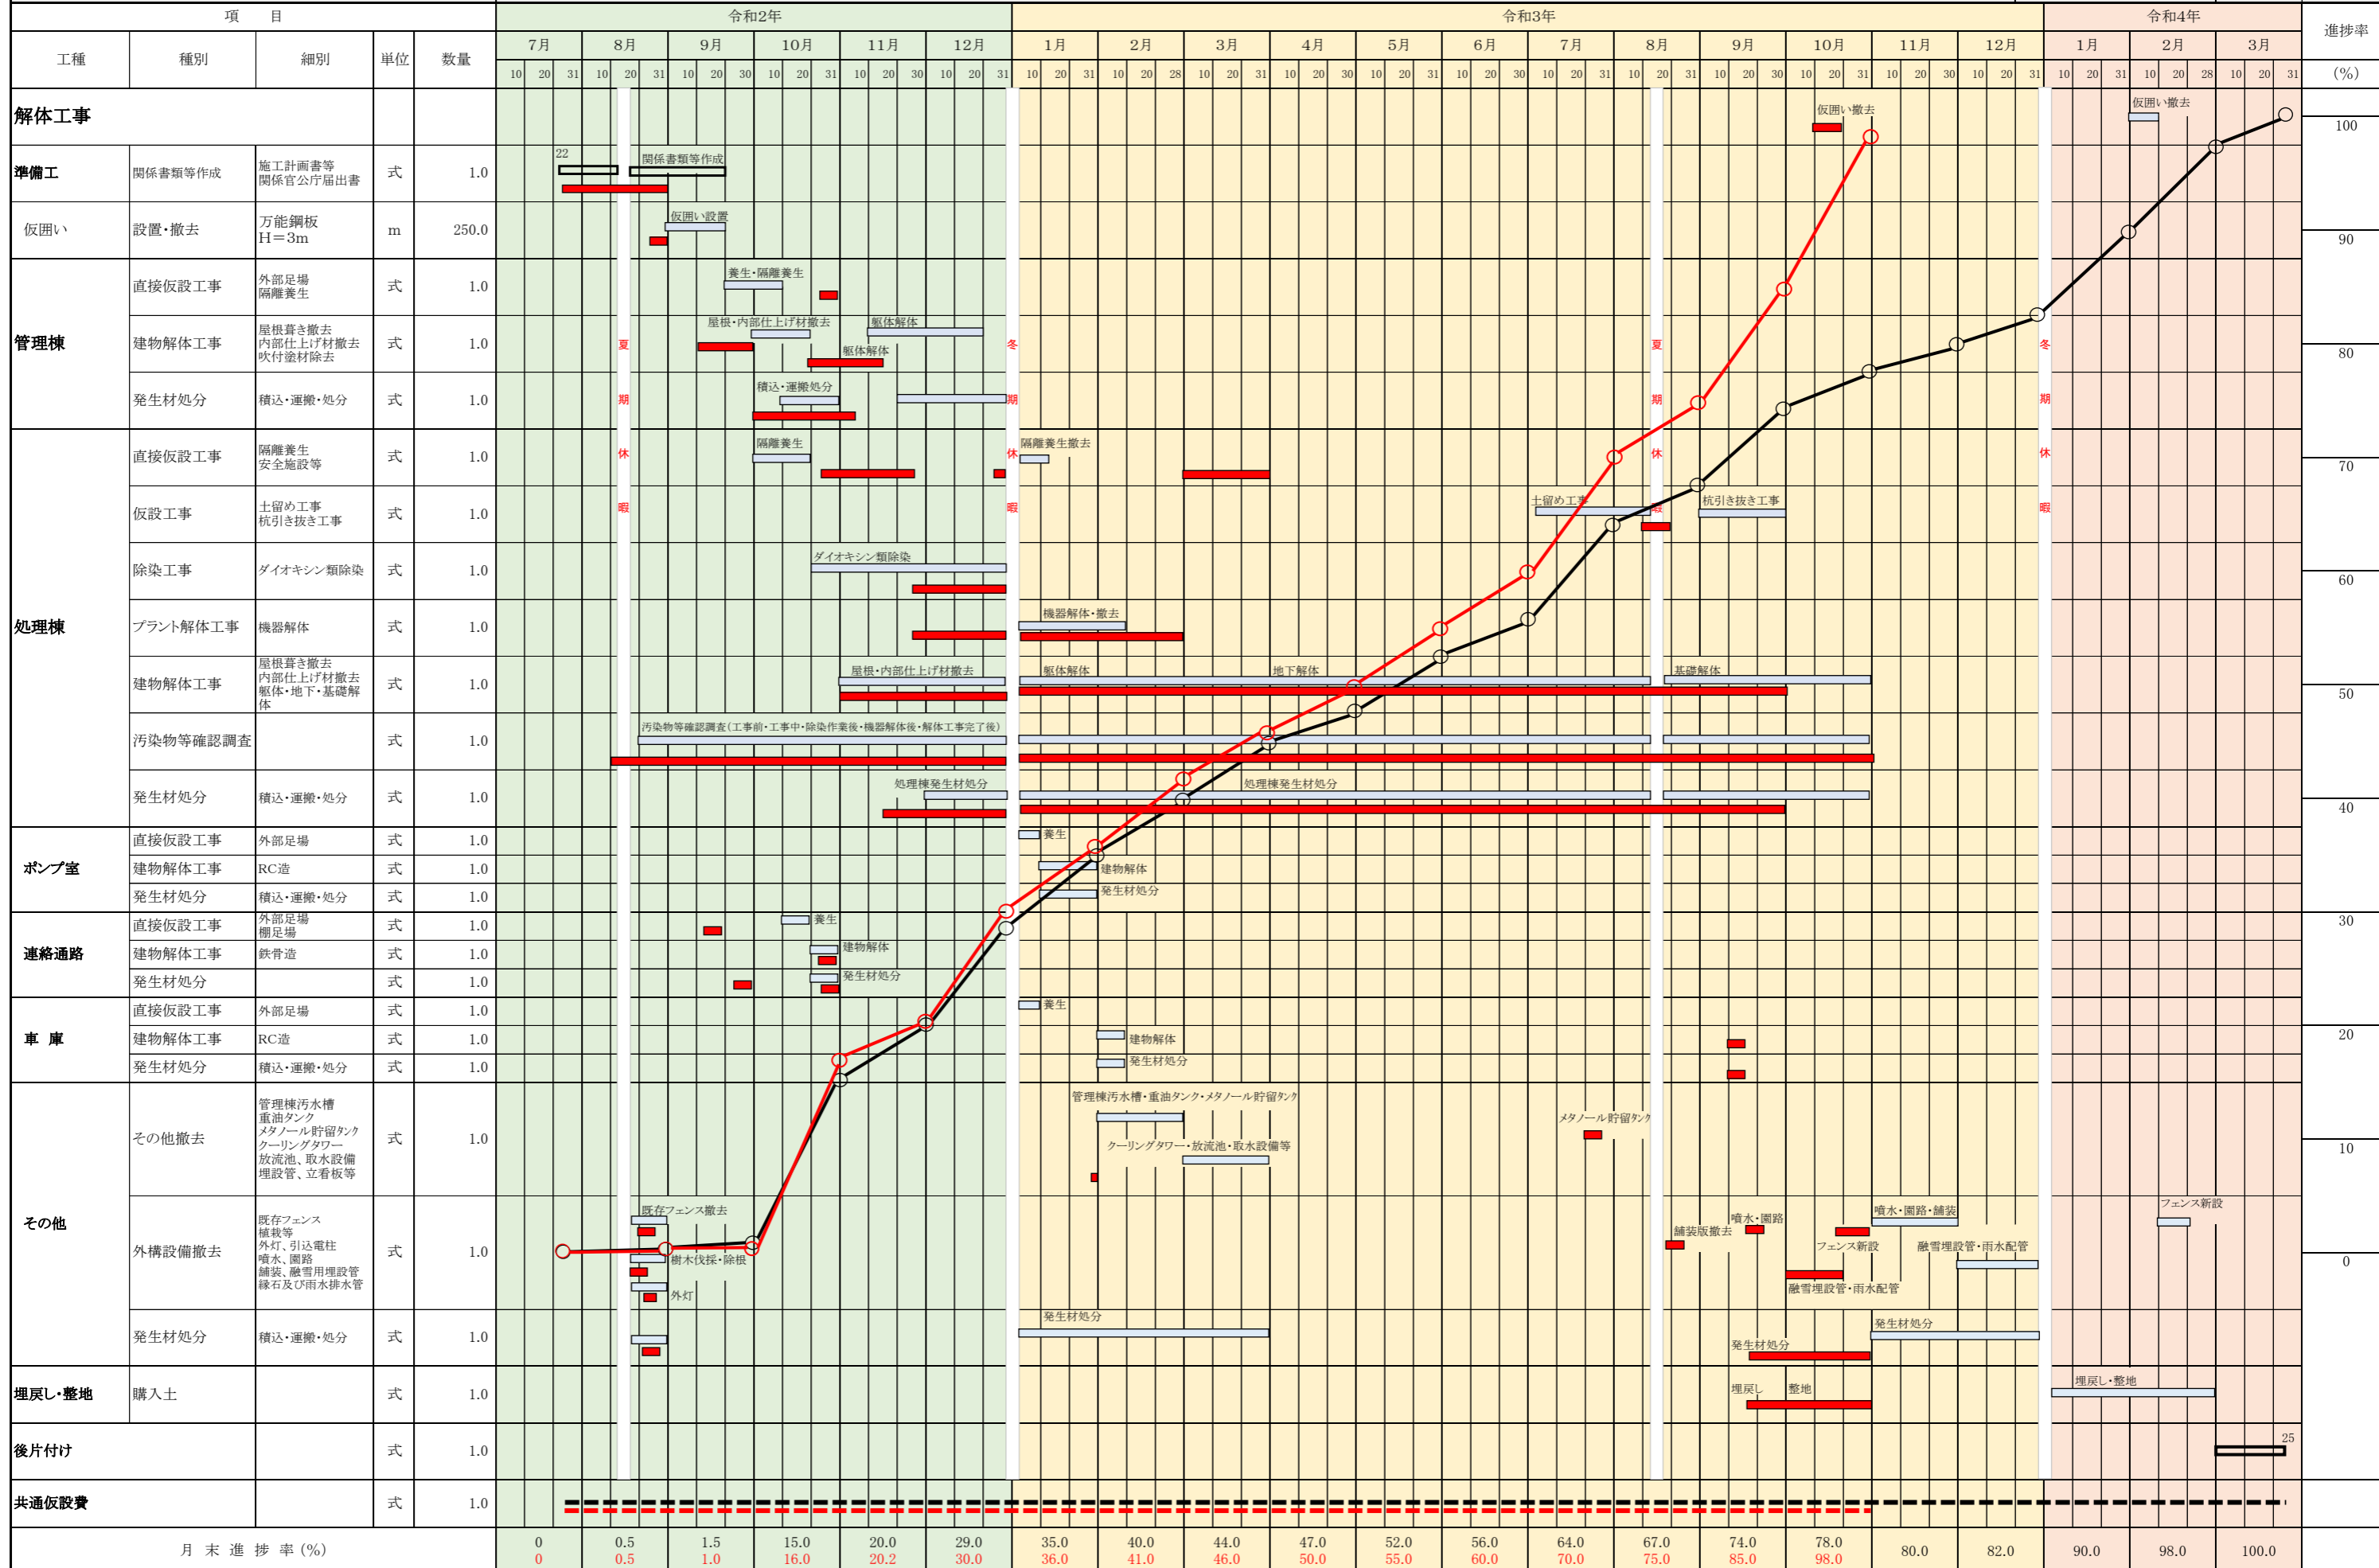

R3年9月末



R3年10月末



No

処理棟

整地・敷均し状況

令和3年10月7日



No

処理棟

整地・締固め状況

令和3年10月7日



No

処理棟

整地・締固め状況

令和3年10月7日



| | |
|------|---------------------|
| 工事名 | 令和3年度 旧中の衛生センター解体工事 |
| 工種 | 外構設備 |
| 位置 | 旧中の衛生センター |
| 設計寸法 | フェンス設置 |
| 実測寸法 | 基礎掘削 |
| 立会者 | 2021.10.20 |

No

フェンス新設

基礎掘削状況

令和3年10月20日



| | |
|------|---------------------|
| 工事名 | 令和3年度 旧中の衛生センター解体工事 |
| 工種 | 外構設備 |
| 位置 | 旧中の衛生センター |
| 設計寸法 | フェンス設置 |
| 実測寸法 | 基礎設置 |
| 立会者 | 2021.10.20 |

No

フェンス新設

基礎ブロック設置状況

令和3年10月20日



| | |
|------|---------------------|
| 工事名 | 令和3年度 旧中の衛生センター解体工事 |
| 工種 | 外構設備 |
| 位置 | 旧中の衛生センター |
| 設計寸法 | フェンス設置 |
| 実測寸法 | |
| 立会者 | 2021.10.26 |

No

フェンス新設

支柱設置状況

令和3年10月26日



No.

フェンス新設

フェンス設置状況

令和3年10月27日



No.

フェンス新設

フェンス設置状況

令和3年10月28日



No.

フェンス新設

フェンス設置状況

令和3年10月28日



| | |
|-------|-------------------------------|
| 工事名 | 令和2年度 旧中尾地区センター解体工事 |
| 工種 | 解体撤去工事 |
| 位 置 | 取水設備 |
| 設計寸法 | 2750×800 |
| 実測寸法 | 取水設備高 22.5m |
| 立 会 者 | 〒168-8502 東京都荒川区西日暮里 20211025 |

No

外構設備撤去

揚水管撤去状況

令和3年10月25日



| | |
|-------|-------------------------------|
| 工事名 | 令和2年度 旧中尾地区センター解体工事 |
| 工種 | 解体撤去工事 |
| 位 置 | 取水設備 |
| 設計寸法 | 2750×800 |
| 実測寸法 | 取水設備高 22.5m |
| 立 会 者 | 〒168-8502 東京都荒川区西日暮里 20211025 |

No

外構設備撤去

揚水管撤去状況

令和3年10月25日



| | |
|-------|-------------------------------|
| 工事名 | 令和2年度 旧中尾地区センター解体工事 |
| 工種 | 解体撤去工事 |
| 位 置 | 取水設備 |
| 設計寸法 | 2750×800 |
| 実測寸法 | 取水設備高 22.5m |
| 立 会 者 | 〒168-8502 東京都荒川区西日暮里 20211025 |

No

外構設備撤去

揚水管撤去完了

令和3年10月25日



No

外構設備撤去

電柱撤去

令和3年10月28日



No

外構設備撤去

電柱撤去

令和3年10月28日



No

外構設備撤去

電柱撤去完了

令和3年10月28日
